	St	Aktivitets kode	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varig...
8	L...	307	Forprosjektrapport	27.04.2015	07.05.2015	8 dager
9	L...	308	Forprosjekt til HF/PL	08.05.2015	08.05.2015	0 dager
10	**Lo**	**309**	**Sakshandsaming**	**11.05.2015**	**18.06.2015**	**27 dager**
11	L...	310	Helse Førde - forprosjekt	11.05.2015	29.05.2015	13 dager
12	L...	311	Helse Vest - forprosjekt	01.06.2015	18.06.2015	14 dager
13	**Lo**	**312**	**Detaljprosjektering**	**06.04.2015**	**11.12.2015**	**161 dager**
14	L...	331	Start det. prosjekt.	06.04.2015	06.04.2015	0 dager
15	L...	314	Rammesøknad	19.06.2015	03.07.2015	11 dager
16	L...	313	Tverrfaglig kontroll anbod	21.09.2015	21.09.2015	0 dager
17	L...	318	Konkurransegrunnlag	03.08.2015	09.10.2015	50 dager
18	L...	319	Anbudsteikningar	27.07.2015	09.10.2015	55 dager
19	L...	315	Tverrfaglig kontroll arb.t.	16.11.2015	16.11.2015	0 dager
20	L...	326	Arbeidsteikningar	15.09.2015	10.12.2015	63 dager
21	L...	325	Utlev. arb. teikningar	11.12.2015	11.12.2015	0 dager
22	L...	316	Avkl. entreprisemodell	03.08.2015	03.08.2015	0 dager
23	L...	317	Annonsering (Doffin)	31.08.2015	31.08.2015	0 dager
24	L...	320	Utlegging Doffin	01.10.2015	15.10.2015	11 dager
25	L...	321	Anbudssynfaring	05.10.2015	05.10.2015	0 dager
26	L...	322	Anbudsfase	01.10.2015	16.11.2015	33 dager
27	L...	323	Kontroll/innstilling	17.11.2015	25.11.2015	7 dager
28	L...		Melding om innstilling	25.11.2015	25.11.2015	0 dager
29	L...	330	Karensperiode/klagefrist	26.11.2015	07.12.2015	8 dager
30	**Lo**	**309**	**Sakshandsaming**	**23.11.2015**	**07.12.2015**	**11 dager**
31	L...	331	Helse Førde - anbod	23.11.2015	07.12.2015	11 dager
32	L...	324	Kontrahering	11.12.2015	16.12.2015	4 dager
33	L...	327	IG-søknader - grunnarbeid	16.12.2015	18.12.2015	3 dager
34	**Lo**	**331**	**Byggefase**	**04.01.2016**	**30.06.2017**	**364 dager**
35	L...	332	Oppstart grunnarbeid	04.01.2016	04.01.2016	0 dager
36	L...	333	Overlevering	30.06.2017	30.06.2017	0 dager

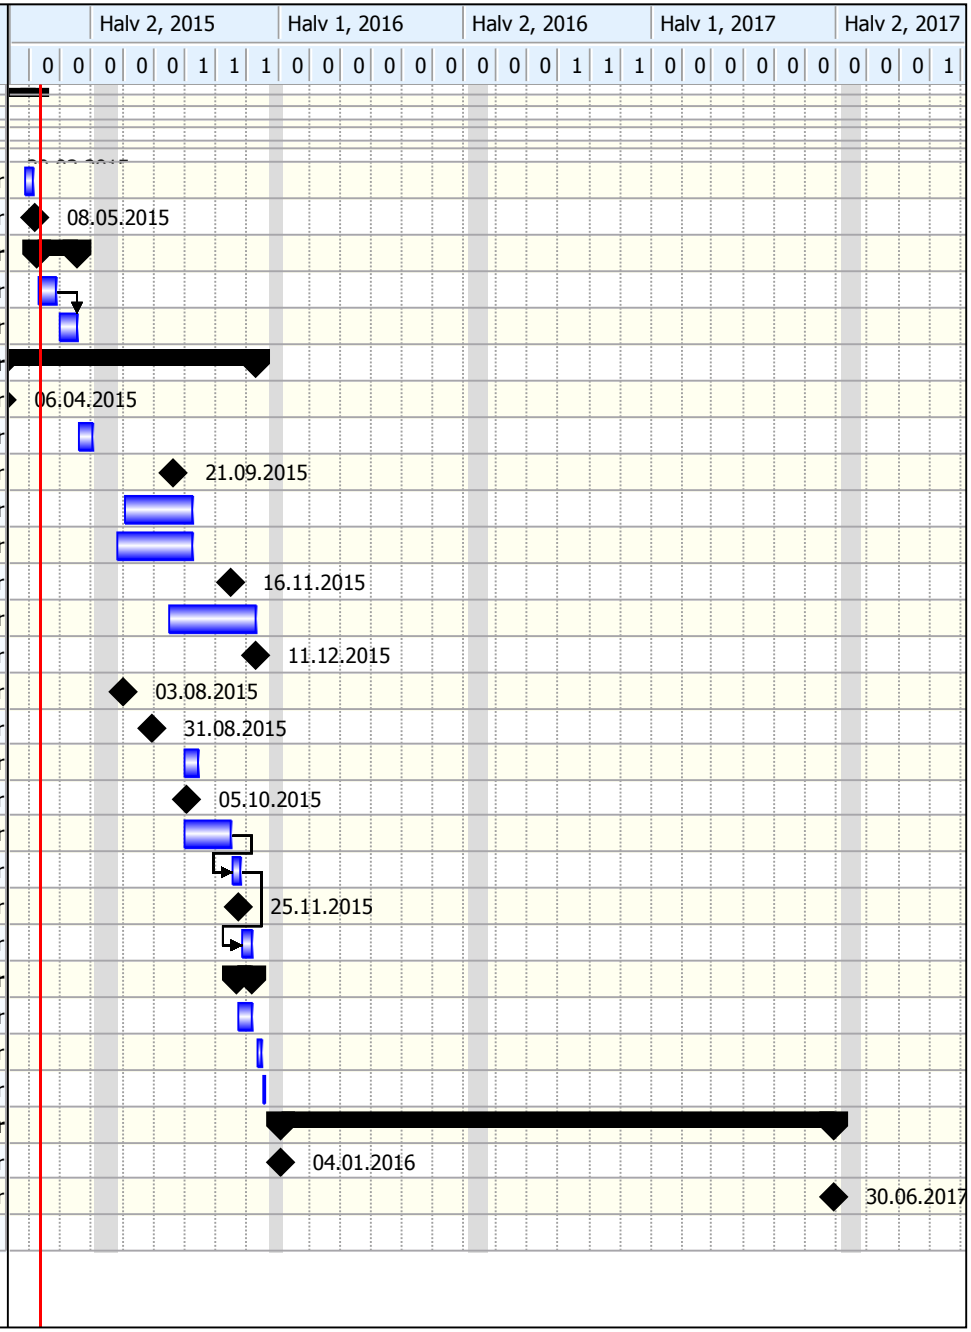

Summasjon
Milepæl
Gjeldende plan
Oppnådd milepæl
Fremdrift (kostnadsvektet)
Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon
